HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ RIKKEI ACADEMY · ON-THE-JOB TRAINING

BÁO CÁO NGHIỆM THU SPRINT 1

DỰ ÁN: GREENPHONE - HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SMARTPHONE


Nhóm phát triển: 6 Thành viên (3 BE · 3 FE) | **Trưởng nhóm (Team Lead):** dangnguyen vu | **Thời gian nghiệm thu:** 30/10/2026 | **Sprint:** Sprint 1 / 4


1. Tuyên Ngôn Mục Tiêu Sprint 1 (Sprint 1 Goal)

> 🎯 ***Mục tiêu tổng thể:*** *"Thiết lập vững chắc kiến trúc nền tảng (Spring Boot 3 & React 19), bảo mật định danh JWT Bearer, hệ thống quản lý danh mục điện thoại kèm ma trận biến thể cấu hình (Color/Storage), luồng mua hàng giỏ hàng chuẩn và quản trị sản phẩm cơ bản; triển khai đóng gói container Docker Compose sẵn sàng chạy trên VPS Ubuntu Production."*

2. Bảng Tổng Hợp Vận Tốc Nhóm (Team Velocity Metrics)

70 SP	62 SP	8 SP	88.6%
CAM KẾT BAN ĐẦU	THỰC TẾ BÀN GIAO (DONE)	HOÃN SANG S2 (DELAY)	TỶ LỆ HOÀN THÀNH

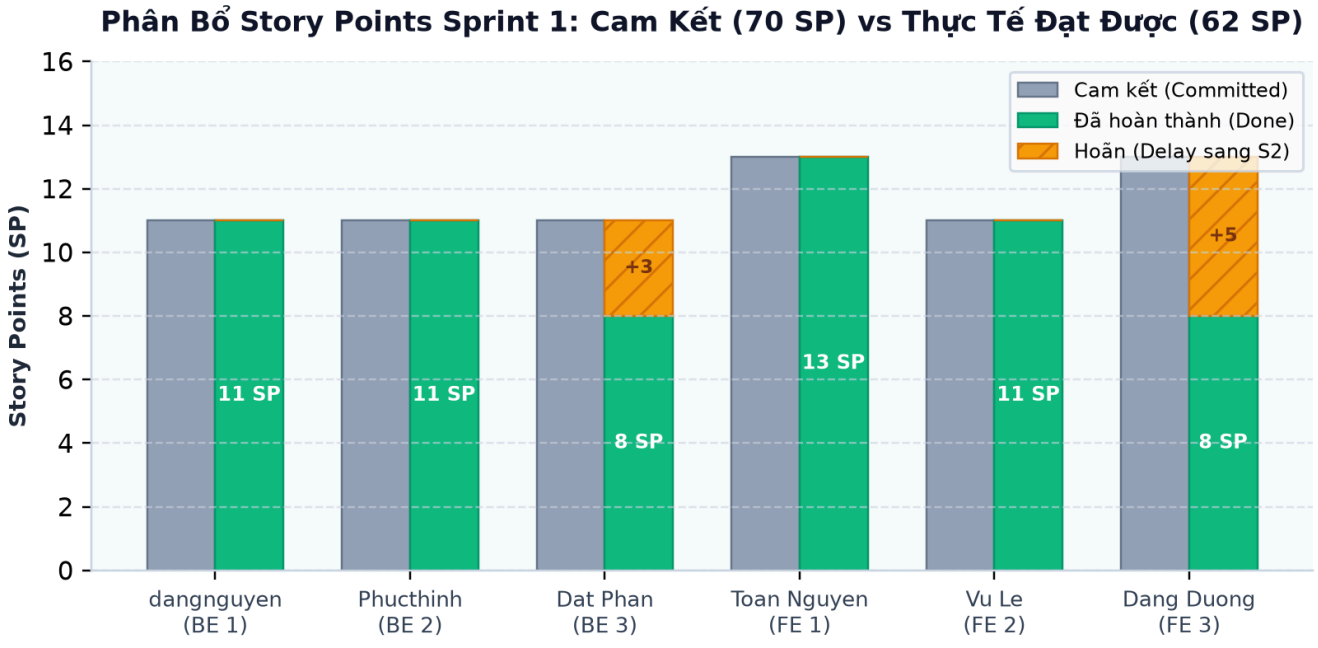

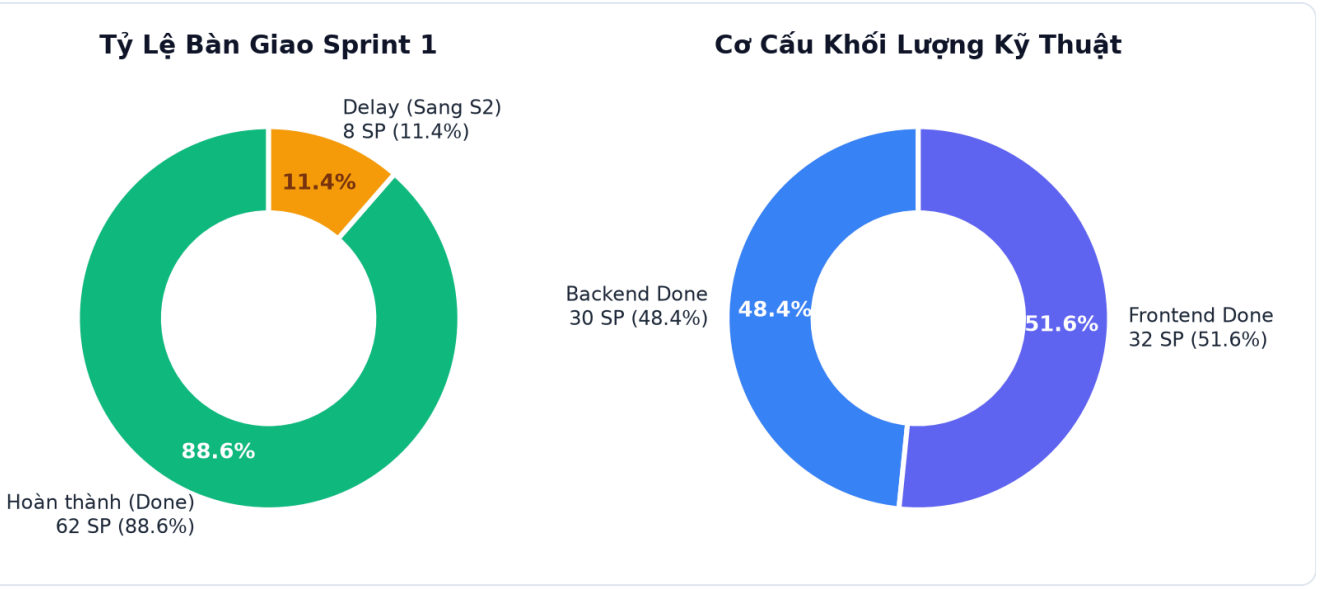
Tỷ Lệ Bàn Giao Sprint 1
Delay (Sang S2)
8 SP (11.4%)
11.4%
88.6%
Hoàn thành (Done)
62 SP (88.6%)
Cơ Cấu Khối Lượng Kỹ Thuật
Backend Done
30 SP (48.4%)
48.4%
51.6%
Frontend Done
32 SP (51.6%)

3. Bảng Phân Bổ Mục Tiêu & Trách Nhiệm Từng Thành Viên

Thành viên	Vai trò	Mục tiêu chính (Personal Sprint Goal)	Số lượng Task	Story Points	Trạng thái
dangnguyen vu @dangnguyenvu	BE 1 - Lead	Dựng khung chuẩn ApiResponse, xử lý lỗi tập trung, xác thực JWT, khởi tạo base Vite React 19 + TypeScript & API hồ sơ cá nhân.	4 / 4	**16 / 16 SP**	100%
38.Phucthinh @38phucthinh	BE 2	Tích hợp Cloudinary CDN upload ảnh đa phương tiện, quản lý thương hiệu (Brand) & cây phân cấp thông số kỹ thuật (Option Tree).	3 / 3	**11 / 11 SP**	100%
Đạt Phan Văn @dtphanvan3	BE 3	Xây dựng Promotion Engine áp mã voucher giảm giá, giỏ hàng Cart Service, kiểm soát điều kiện biến thể.	2 / 3	**8 / 11 SP** (3 SP Delay)	72.7%
Toàn Nguyễn Văn @toannguynvan12	FE 1	Form Auth đăng ký/đăng nhập kèm validation, trang chi tiết máy PDP chọn biến thể đổi giá theo thời gian thực.	2 / 2	**8 / 8 SP**	100%
vũ Nguyễn Lê @vunguynle1	FE 2	Thiết kế Header cố định có badge giỏ hàng, Mega menu danh mục hãng, Trang chủ Homepage & Sidebar bộ lọc đa tiêu chí đồng bộ URL query.	3 / 3	**11 / 11 SP**	100%
Đăng Dương @dangduongre	FE 3	Trang giỏ hàng (/cart) toàn diện với chọn món & Freeship, giao diện quản trị Admin Product CRUD kèm upload ảnh Cloudinary.	2 / 3	**8 / 13 SP** (5 SP Delay)	61.5%
TỔNG CỘNG TOÀN ĐỘI GREENPHONE			**16 / 18 Tasks**	**62 / 70 SP (Done)**	88.6%

4. Phân Tích Chuyên Sâu 2 Nhiệm Vụ Delay & Kế Hoạch Bù Tiến Độ

> ⚠️ **Báo cáo trung thực và quản trị rủi ro kỹ thuật:** Nhóm đã chủ động tách và chuyển 2 tác vụ dưới đây vào danh sách Delay để đảm bảo chất lượng kiểm thử cao nhất, không chạy đua số lượng mà đưa code lỗi vào nhánh chính.

[3 SP] [BE3] Kiểm Tra Tồn Kho Biến Thể Thời Gian Thực & Validate Variant

Tác vụ phụ trách: Đạt Phan Văn (BE3)

- **Nguyên nhân Delay:** Logic kiểm tra tồn kho độc lập đã chạy được ở mức đơn giản, tuy nhiên khi ghép nối luồng bán hàng với nhiều biến thể đồng thời (Màu sắc x Dung lượng), cần phải triển khai cơ chế *Khóa bi quan (@Lock(LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE))* và liên kết trực tiếp với Webhook thanh toán SePay để chống bán âm kho (Overselling).
- **Giải pháp & Kế hoạch bù tiến độ Sprint 2:** Kết hợp trực tiếp task này vào Task BE3-01 của Sprint 2 (Khóa tồn kho chống bán âm). Đạt Phan Văn sẽ hoàn thành kiểm thử tích hợp ngay trong 3 ngày đầu của Sprint 2.

[5 SP] [FE3] Giao Diện Đặt Hàng & Thanh Toán Đa Bước (Multi-Step Checkout Flow)

Tác vụ phụ trách: Đăng Dương (FE3)

- **Nguyên nhân Delay:** Giao diện khung form và stepper đã dựng xong ở frontend, nhưng chưa có API Webhook tạo mã VietQR động từ Backend SePay ở Sprint 1 để test hoàn chỉnh kịch bản "Quét mã QR ➔ Thanh toán thành công ➔ Nhận hàng". Nếu demo giả lập thì chưa phản ánh đúng giá trị thực chiến.
- **Giải pháp & Kế hoạch bù tiến độ Sprint 2:** Phối hợp với BE 1 (dangnguyen vu) ngay khi SePay Webhook Controller hoàn tất ở tuần đầu Sprint 2 để ghép API thật, hoàn thiện luồng Checkout thanh toán tự động không quá ngày thứ 4 của Sprint 2.

5. Danh Mục 16 Nhiệm Vụ Đã Nghiệm Thu Hoàn Thành (Done 100%)

Mã Task	Tên nhiệm vụ kỹ thuật	Điểm	Người làm	File mã nguồn chính	Kết quả kiểm thử
BE1-01	Base Architecture, Exception & ApiResponse	3 SP	dangnguyen vu	ApiResponse.java, GlobalExceptionHandler.java	✓ Pass 100%
BE1-02	Authentication Service (JWT Bearer & Security)	5 SP	dangnguyen vu	JwtTokenProvider.java, SecurityConfig.java	✓ Pass 100%
BE1-03	User Profile & Sổ Địa Chỉ Giao Hàng	3 SP	dangnguyen vu	UserController.java, UserService.java	✓ Pass 100%
BE2-01	Tích Hợp Upload Ảnh Cloudinary CDN	3 SP	38.Phucthinh	CloudinaryConfig.java, CloudinaryService.java	✓ Pass 100%
BE2-02	Quản Lý Hãng Sản Xuất (Brand) & Banner	3 SP	38.Phucthinh	BrandController.java, BannerService.java	✓ Pass 100%
BE2-03	Cây Thuộc Tính & Thông Số Kỹ Thuật (Option Tree)	5 SP	38.Phucthinh	OptionController.java, OptionItem.java	✓ Pass 100%
BE3-01	Voucher Engine & Module Mã Giảm Giá	5 SP	Đạt Phan Văn	PromotionService.java, Promotion.java	✓ Pass 100%
BE3-02	Giỏ Hàng & Quản Lý Cart Items Service	3 SP	Đạt Phan Văn	CartController.java, CartService.java	✓ Pass 100%
FE1-01	Khởi Tạo Frontend Base (React 19 + Vite + TS)	5 SP	dangnguyen vu	main.tsx, AppRoutes.tsx, axiosClient.ts	✓ Pass 100%
FE1-02	Giao Diện Đăng Ký, Đăng Nhập & Quên Mật Khẩu	3 SP	Toàn Nguyễn Văn	LoginPage.tsx, RegisterPage.tsx	✓ Pass 100%
FE1-03	Trang Chi Tiết Điện Thoại (PDP) Đổi Giá Realtime	5 SP	Toàn Nguyễn Văn	ProductDetailPage.tsx, VariantPicker.tsx	✓ Pass 100%
FE2-01	Header Cố Định, Badge Giỏ Hàng & Footer	3 SP	vũ Nguyễn Lê	Header.tsx, Footer.tsx, BrandDropdown.tsx	✓ Pass 100%
FE2-02	Trang Chủ (Homepage) & Banner Carousel	3 SP	vũ Nguyễn Lê	HomePage.tsx, HeroBanner.tsx	✓ Pass 100%
FE2-03	Danh Sách Sản Phẩm & Sidebar Bộ Lọc Đa Tiêu Chí	5 SP	vũ Nguyễn Lê	ProductsPage.tsx, FilterSidebar.tsx	✓ Pass 100%
FE3-02	Trang Giỏ Hàng (/cart), Freeship Progress & Voucher	3 SP	Đăng Dương	CartPage.tsx, cartSlice.ts	✓ Pass 100%
FE3-03	Giao Diện Admin: Quản Lý Sản Phẩm & Biến Thể Kho	5 SP	Đăng Dương	AdminProductsPage.tsx	✓ Pass 100%

6. Đánh Giá & Cam Kết Chuyển Tiếp Sang Sprint 2

Nhận xét chung từ Trưởng nhóm: Sprint 1 đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kiến trúc nền tảng và bảo mật dữ liệu, tạo bàn đạp vững chắc cho toàn bộ chu kỳ phát triển. Tỷ lệ hoàn thành 88.6% (62/70 SP) phản ánh đúng thực tế năng lực

và tinh thần làm việc nghiêm túc, không che giấu lỗi kỹ thuật.

Cam kết Sprint 2: Toàn đội sẽ ưu tiên dứt điểm 2 task Delay (8 SP) trong 3 ngày đầu tiên, song song triển khai các tính năng chủ lực: Cổng thanh toán VietQR SePay, Khóa bi quan chống bán âm kho và Hệ thống Đánh giá Review sản phẩm.

ĐẠI DIỆN NHÓM PHÁT TRIỂN (LEAD TECH)	GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN / MENTOR RIKKEI
dangnguyen vu	Ký và ghi rõ họ tên

Tài liệu này được sinh tự động và đồng bộ với Trello Board GreenPhone (https://trello.com/b/LBnO1w9t/greenphone-smartphone-e-commerce)
